《文化挪用视角下的敦煌文化数字媒体艺术研究》

项目章程与传播方案

平时作业二 · 敦煌文化研究阶段 | 第三组 | 陈锦育 · 吴灿 · 陆健民 | 完成日期：2026 年 9 月 30 日

一、项目名称与背景

1、项目名称

文化挪用视角下的敦煌文化数字媒体艺术研究

2、项目背景

一幅敦煌图像如果被裁剪、重新配色，或放进新的设计中，观众可能只看到它好看的部分，却不知道它来自哪里、原来表达什么。我们以这类使用方式为研究入口，关注文化图像在重新使用时，哪些信息被保留，哪些信息被省略。我们想做一件以敦煌文化为素材的数字媒体艺术装置，讨论的问题是：文化图像被移到新的场景中使用时，人们还能不能了解它原来的含义？我们计划把图像展示和观众操作结合起来，让观众在观看、比较的过程中思考这一问题。

文化挪用涉及对其他文化的图像、符号或实践的取用。判断一种使用是否有问题

需要了解谁在使用、如何说明来源，以及使用双方的关系，不能只看图像有没有被改动；Rogers 的研究为这种结合具体情境的分析提供了参考[1]。因此，我们不会把所有改编都认定为不当挪用，也不会把观众觉得"不舒服"直接当作判断依据。查不到的信息会标为待核实，自己的理解会与原资料的说法分开记录。

研究分三步推进：先阅读文化挪用相关文献，弄清主要概念；再选取敦煌图像的使用实例，把原图出处和新的使用方式放在一起比较；最后尝试用电脑和投影展示图像，检查画面与说明能否看清。研究结果将用来修改装置构想。本阶段（2026 年 10 月 1 日至 14 日）的任务是完成资料整理与显示测试，并向老师和同学介绍方案、收集意见；装置制作和论文写作随后继续推进。

二、项目目标与愿景

1、核心目标

总体目标：为装置创作准备资料和初步测试结果，使小组能够说明为什么做、图像从哪里来，以及下一步需要验证什么。

具体目标：①查文献——整理至少 3 项相关来源，记录作者、标题、出处和主要观点，只看到摘要的资料注明阅读状态；②找实例——选取至少 2 个敦煌图像被重新

使用的实例，记录原图来源、新的用途和发生的变化，信息不足的地方列出待查问题；③做材料和测试——完成研究说明、流程图及 4—6 页汇报稿，用少量图片测试电脑播放和投影显示，留下照片或截图并记录发现的问题；④听意见——做一次课堂汇报，了解别人是否听懂选题，收集至少 3 条能够帮助修改资料、图示或说明文字的建议；⑤整理文件——把文献、图像、测试记录和汇报稿按类别保存，写明下一步要补查或修改的内容。以上为计划目标。

2、项目愿景

我们希望在这一阶段把问题讲清楚，而不是先给结论：把资料来源、使用方式和还不确定的地方一并摆出来，让老师和同学能够看明白，也能提出意见。如果一页简介、一张流程图和一次显示测试就能让别人听懂我们要讨论什么，这段工作就有了继续下去的基础。这套"图像—来源—新用途"的对照做法与测试记录，将延续到本学期的后续阶段和毕业设计，用于持续研究、创作试验与论文写作。

三、范围与可交付物

1、范围说明

范围类型	包含内容	排除内容
作品范围	数字媒体艺术装置的初步构想与显示测	本阶段不搭建实体装置成品，不确定材

范围类型	包含内容	排除内容
	试：把图像和相关说明分层展示，观众从不同位置观看，并通过操作比较画面的变化；用电脑播放并连接投影仪做功能检查；产出装置构想示意图（图 3-1）、4—6 页汇报稿与测试记录。	料、尺寸与操作方式，不做扩大制作前的支架与通行检查（留待小尺寸试样通过后再评估）；不完成毕业设计作品与论文正文。
活动范围	文化挪用相关文献阅读与资料目录整理；敦煌图像使用实例比较（记录原图来源、新用途与发生的变化）；阶段研究说明与流程图；显示测试；课堂汇报与意见收集；阶段文档提交。	不组织公开展览与对外传播，不做商业推广与授权谈判；本阶段不开展被试调查，只面向教师与同学收集意见；不购买新设备，先使用现有电脑、投影仪与软件。
可交付物	文献与资料目录（阅读记录、出处与待查项，10 月 4 日）；阶段研究说明（可编辑文档与研究流程图，10 月 6 日）；图像显示测试（功能检查及简短记录，10 月 8 日）；课堂汇报与复盘（演示文稿、意见清单，10 月 14 日）；P01—P07 共 7 份课程交流材料；装置初步构想示意图（图 3-1）；阶段资源与预算表。	不交付实体装置与毕业设计论文；不外发未核实来源的资料与他人未授权的图片；电子表单等不产生费用的物料不重复计入预算。

2、项目制作技术

先整理图片及出处说明，再用电脑播放并连接投影仪，检查图片和文字是否清楚切换是否正常。每次测试记录使用的设备、操作步骤、结果和问题。

3、初步技术构想

初步设想是把图像和相关说明分层展示，让观众从不同位置观看，并通过操作比较画面的变化。下图由 AI 辅助绘制，尚未搭建验证；材料、尺寸和操作方式仍需调整，图内名称、层数、材料和控制方式均为暂拟。

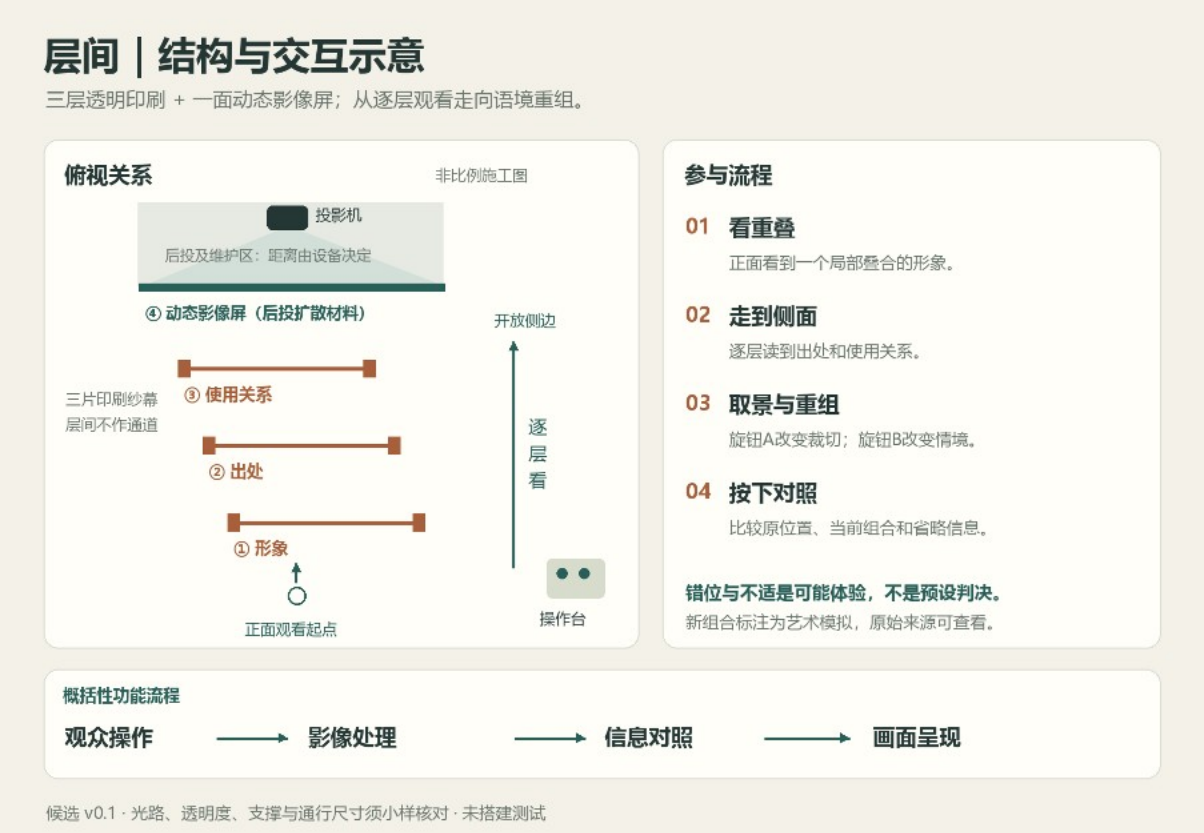


图 3-1　初步结构与交互构想（尚未验证）

来源：本组构想，AI 辅助绘制。

下一步先做小尺寸试样：看多层画面会不会互相遮挡、投影是否清楚、操作后画面能否正常变化。扩大制作前，再检查支架是否牢固、观众是否方便通行。

4、阶段资源与预算

前期使用已有电脑、投影仪和可用软件，暂按 200 元安排打印、少量试样和文具费用。下表是预估金额（本组阶段测算，非供应商报价），购买时记录实际支出；装置正式制作的费用，等材料和尺寸确定后再计算。

费用类别	明细说明	金额（元）	备注
资料印制	说明页、流程图等	60	按需少量印制

费用类别	明细说明	金额（元）	备注
基础小样	少量打印纸、试样材料	60	用于前期试验
辅助耗材	装订与记录用品	40	优先复用现有用品
预备金	补打样及耗材更换	40	保留支出记录
设备与软件	利用现有可用资源	0	新增需求另行评估
合计	**前期研究预算**	**200**	**按实际支出核对**

谁购买、谁记录用途和金额，并保存收据或订单。预备金只有实际使用后才计入支出。需要新增设备时，先讨论能否借用，再决定是否购买。

四、关键里程碑

计划用 2026 年 10 月 1 日至 14 日完成一轮前期工作：先查资料，再整理说明和做测试，最后汇报、收集意见并修改。日期可按课程安排调整，装置制作和论文写作随后继续推进。

里程碑	计划时间	交付物	负责角色
M1 确定问题	10 月 1 日—2 日	研究问题清单与资料分类	三人（吴灿汇总）
M2 资料整理	10 月 3 日—4 日	文献笔记、图像实例与待查问题	陆健民
M3 整理说明	10 月 5 日—6 日	说明文档与流程图	陈锦育（陆健民供文字）
M4 显示测试	10 月 7 日—8 日	显示测试照片与问题记录	陈锦育
M5 课程交流	10 月 9 日—11 日	汇报材料与意见记录	吴灿（陈锦育试播）
M6 修改整理	10 月 12 日—14 日	修订稿、复盘和下阶段清单	三人（陆健民记录）
后续毕业设计	本学期后续阶段	持续研究、创作试验与论文写作	三人

每个节点都要留下表中列出的文件。10 月 3 日先分享资料目录初稿，10 月 4 日完成本轮整理；10 月 10 日汇报，10 月 14 日前完成修改。最后列出下一步要解决的具体问题。

五、主要风险与应对措施

风险类型	具体描述（可能性 / 影响程度）	应对措施
资料来源风险	资料出处不明确或转述失真（可能性：中；影响程度：高）	逐条记录来源；无法核实的结论不写成确定事实。
范围风险	研究范围过大影响进度（可能性：中；影响程度：高）	按研究问题安排任务优先级，每周检查工作量与完成情况。
进度风险	阶段计划与课程时间冲突（可能性：中；影响程度：中）	核对课程通知，统一调整制作与交流日期。
技术风险	设备或文件兼容性问题（可能性：中；影响程度：中）	提前试开文档与演示文件，保留通用格式备份。
协作风险	文件版本不一致（可能性：中；影响程度：中）	统一文件命名与版本日期，汇总前核对修改记录。
记录风险	讨论反馈记录不完整（可能性：中；影响程度：中）	指定记录人，在交流当日整理问题、建议与后续任务。

每周小组会检查这些问题是否出现，由对应负责人处理。修改资料或计划时，记下修改日期和原因。

六、成功标准

1. 量化指标：整理至少 3 项相关文献来源，记录作者、标题、出处和主要观点（只看到摘要的注明阅读状态）；选取至少 2 个敦煌图像被重新使用的实例，记录原

图来源、新用途与发生的变化；完成研究说明、流程图及 4—6 页汇报稿；用少量图片测试电脑播放和投影显示，留下照片或截图并记录发现的问题；完成一次课堂汇报，收集至少 3 条能够帮助修改资料、图示或说明文字的建议；传播材料累计查看 20 次、提问与评论 6 次、他人转发 1 次、交流到场 6 人；前期支出控制在 200 元预算内。

2. 质量指标：文献、图像与测试记录按类别保存，每份材料写清标题与日期，引用的文字和图片标明出处；查不到的信息标为待核实，自己的理解与原资料的说法分开记录；不把所有改编都认定为不当挪用，也不把观众觉得"不舒服"直接当作判断依据，无法核实来源的结论不写成确定事实；发布前在实际使用的电脑上打开检查，确认文字与图片显示正常；文件命名与版本日期统一，汇总前核对修改记录；支出逐笔记录用途与金额并保存收据或订单，预备金实际使用后才计入。

3. 专业价值：为后续毕业设计建立可核查的资料基础与测试记录，使小组能够说明"为什么做、图像从哪里来、下一步需要验证什么"；形成"图像—来源—新用途"的对照记录方法，以及可复用的研究流程图与阶段评估指标；本阶段结论只作为修订装置构想的依据，不代替正式研究成果。

七、团队成员与职责

三人共同讨论选题，具体工作各有负责人：吴灿负责任务与进度，组织讨论并汇总阶段材料；陈锦育负责设备试播、显示测试与流程图、说明页面；陆健民负责查资料、撰写阶段文字与提交反馈；交稿前由另一名成员检查。

角色	成员	负责内容	主要职责
项目负责人	吴灿	任务与进度	组织讨论、汇总阶段材料；连接设备、测试画面并记录问题
技术制作	陈锦育	基础测试	提前试播图片与演示文件，检查投影是否清楚、切换是否正常
视觉设计	陈锦育	图表与汇报稿	整理流程图和课堂说明页面
文案策划	陆健民	文献与说明	核查出处、撰写阶段文字
交流协调	陆健民	提交与反馈	对接课程要求、整理意见与记录

每周开一次简短小组会，每人说明做完了什么、遇到什么问题、下周做什么。陆健民提供资料与文字，陈锦育提供测试记录，吴灿汇总成汇报稿；工作量不均时在会上调整。

八、传播方案

1、传播背景与目标

传播的主要对象是老师和同学。我们会用一页简介说明为什么做这个项目，用图像实例和装置示意图解释准备怎么做，再通过课堂汇报听取意见。希望解决的问题是：别人能否听懂我们的选题，图示和文字是否清楚。两周内计划获得 20 次材料查看、6

次提问或评论、1 次他人转发，并邀请至少 6 人参加交流，收集至少 3 条具体修改建议（以上是预期目标，统计办法见本方案第 4 部分）。介绍顺序为：先说想讨论什么，再展示找到的资料，接着说明装置的初步想法，最后请大家指出没听懂或需要改进的地方。

目标受众：核心受众为授课教师与同学。请老师帮助判断研究问题是否清楚、引用资料是否合适；请同学指出哪些地方难懂、能否理解图中装置大致怎么观看和操作。内容与渠道适配：班级群或课程平台用于分享简介和进展，课堂汇报用于展示图片并当面回答问题，正式文档提交到课程指定平台；具体使用哪个平台、何时汇报，按课程安排确定。汇报后问三个问题：你认为我们在研究什么？你是否看懂了装置示意图？哪一处最需要补充说明？目前还没有完成这项调查，收到回答后再整理结果。

2、传播主题与核心信息

2.1 传播口号

看见图像，也了解它的来处。

2.2 核心信息点

① 研究什么：以敦煌图像为例，讨论文化图像被重新使用时，原来的含义是否得

到说明。② 准备做什么：尝试用图像展示和观众操作组成一件艺术装置，目前先查资料、做显示测试和修改示意图。③ 希望得到什么意见：请大家告诉我们选题是否说清楚、图示是否看得懂，以及还需要补充什么。

2.3 调性关键词

清楚、简洁、真实、友好。少用专业词，先用图片和例子说明问题，再补充必要的概念解释。

2.4 简介文案

当一幅敦煌图像被用在新的设计里，我们看到的是它的外观，还是也了解它原来的含义？我们想围绕这个问题做一件数字媒体艺术装置。目前正在整理资料和初步构想，接下来会进行简单测试。欢迎看看我们的图示，告诉我们哪里没说清楚。

3、传播策略与节奏

3.1 预热期（10 月 1 日—4 日）

先发一页项目简介，说明想研究什么、为什么选择敦煌图像；再分享资料目录初稿，让同学知道我们正在查哪些问题。

3.2 集中交流期（10 月 5 日—10 日）

分享研究步骤和显示测试记录。课堂上用 4—6 页汇报稿展示选题、图像实例与装置示意图，并留出提问时间，记录大家没听懂的地方。

3.3　延续期（10 月 11 日—14 日）

整理收到的问题，决定哪些需要补查资料、哪些需要改文字或图示。发布一页修改说明，再把整理后的文档提交到课程平台。

3.4　发布与版本管理

每份材料由负责人先做，另一人检查错字、出处和图片是否清楚，再按计划发布文件名写上日期，修改后保留新版本，方便三人核对。

4、传播渠道规划、传播内容排期、传播物料清单与效果评估

4.1　渠道规划

传播渠道	渠道定位	适配内容形式	发布频率
课程指定提交平台	正式作业提交	阶段文档与课程要求附件	阶段提交 1 次
课程内交流渠道	摘要与进展沟通	项目简介、资料目录、修改说明	拟 5 次更新
课堂阶段交流	集中说明与讨论	简短演示文稿、资料页	拟 1 次

陈锦育提前试播图片和演示文件、整理汇报页面，陆健民确认提交入口和汇报时间。三人确认内容一致后再发布。

4.2　传播内容排期

下表是 2026 年 10 月 1 日至 14 日的两周传播计划。共安排 5 次线上更新、1 次课堂汇报和 1 次文档提交，日期可按课程安排调整。

时间	渠道	内容主题	形式	负责人
10 月 1 日	课程内交流	P01 预热 · 项目简介	一页摘要	吴灿
10 月 3 日	课程内交流	P02 预热 · 资料目录初稿	文字目录	陆健民
10 月 6 日	课程内交流	P03 集中 · 研究流程说明	流程图	吴灿
10 月 8 日	课程内交流	P04 集中 · 显示测试记录	简短记录	陈锦育
10 月 10 日	课堂交流	P05 集中 · 阶段汇报与提问	演示文稿	吴灿
10 月 12 日	课程内交流	P06 延续 · 问题与修订说明	问题清单	陆健民
10 月 14 日	指定提交平台	P07 延续 · 课程阶段提交	文档	吴灿

P01—P07 是材料编号，可在下一部分找到每份材料的规格、完成时间和负责人。

4.3 传播物料清单

物料名称	形式或规格	完成时间	负责人
P01 研究摘要	A4 一页，研究主题与阶段任务	9 月 30 日	吴灿
P02 资料目录	1—2 页初稿，列出来源与待查问题	10 月 2 日	陆健民
P03 研究流程图	A3 或等比例电子图，概括研究步骤	10 月 5 日	吴灿
P04 显示测试记录	1 页，设备、测试照片与发现的问题	10 月 7 日	陈锦育
P05 课堂汇报	4—6 页，选题、实例、示意图与问题	10 月 9 日	吴灿
P06 问题清单	1 页，实际意见与修订安排	10 月 11 日	陆健民
P07 阶段提交文件	可编辑文档，按模板结构编排	10 月 13 日	吴灿

其中阶段说明页 40 元、研究流程图 20 元、反馈记录为电子版 0 元，合计 60 元，

已计入第三部分资源与预算的印制费，不重复计算。每份材料都写清标题和日期，引用的文字、图片标明出处；发布前在实际使用的电脑上打开检查，确认文字和图片显示正常。

4.4　效果评估

评估指标	目标值	统计方式
材料查看次数	累计 20 次	以平台可提供的查看数据为准；无法取得时注明无法统计。
互动量（提问与评论）	累计 6 次	记录与主题有关的问题或评论，组内自查不计入。
他人转发量	1 次	记录组外人员实际转发的时间和渠道；小组自行发布不计入。
交流到场人数	6 人	按实际参与计数，同场重复进入不重复计。
有效建议	至少 3 条	能够指向资料、范围或表达改进的具体建议。

计划在 10 月 15 日整理结果：有多少人查看和参加讨论，大家主要问了什么，我们据此改了哪里。没有查看数据就注明无法统计，不用群人数代替阅读量。每条采纳的建议写出对应修改；尚未解决的问题列入下一轮工作。
